



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2016-RDC

Memo nº08/2017

Maceió-AL 11 de setembro 2017

A Sua Excelência o Senhor

PAULO DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR

Secretário de Estado da Segurança Pública

C/C para o Sr. DELANO SOBRAL ROLIM *Secretário Executivo de Gestão Interna*

Assunto: encaminhamento de Relatório IV do Contrato 001-2017 RDC.

Senhor Secretário venho por meio deste encaminha relatório mensal da Gestão do Contrato 001/2017 RDC que trata das construções dos Centros Integrados de Segurança Pública,

Respeitosamente;

FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO- TEN CEL QOC PMAL
GESTOR DO CONTRATO 001-2016/RCD

Recebi em
11/09/17
mdellej



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Endereço: Rua Zadir Índio, 213 – Centro
Maceió - AL – CEP: 57020-480– Fone: (82) 3315-3322

Recebido em
11/09/17
Natalia





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2017-RDC

RELATÓRIO IV


Relatório do Contrato do contrato 001-2017 RDC datado de 02 de maio de 2017 no valor de R\$ 5.700.000,00 tem como objeto a construção de 05 CISP nos Municípios de Igaci, Viçosa, São Luís do Quitunde, Junqueiro e Pão de Açúcar.

Situação das Construções dos CISP'S:

Viçosa: obra inaugurada pelo Exmo. Senhor Governador do Estado em 31 de agosto do ano de 2017, dentro do prazo estabelecido pelo contrato 110 dias para executar a obra;


Cisp resgata valorização de policiais e traz mais segurança para Viçosa

Governador Renan Filho e Secretário executivo de Segurança inauguraram unidade durante Governo Presente

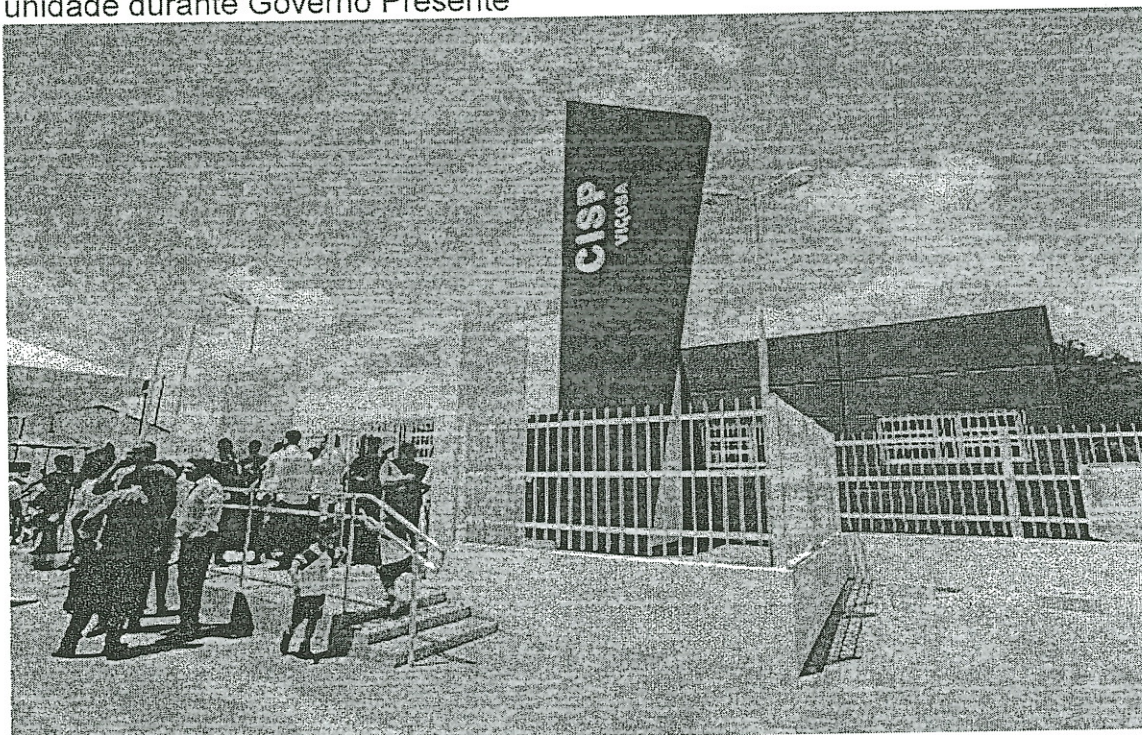


Fonte: <http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/19082-cisp-resgata-valorizacao-de-policiais-e-traz-mais-seguranca-para-vicosa>

Igaci: obra em execução, Ordem de Serviço expedida em 29 de maio de 2017 até a suspensão do contrato já transcorreram 99 dias em um total de 120 dias prazo contratual para execução da obra;

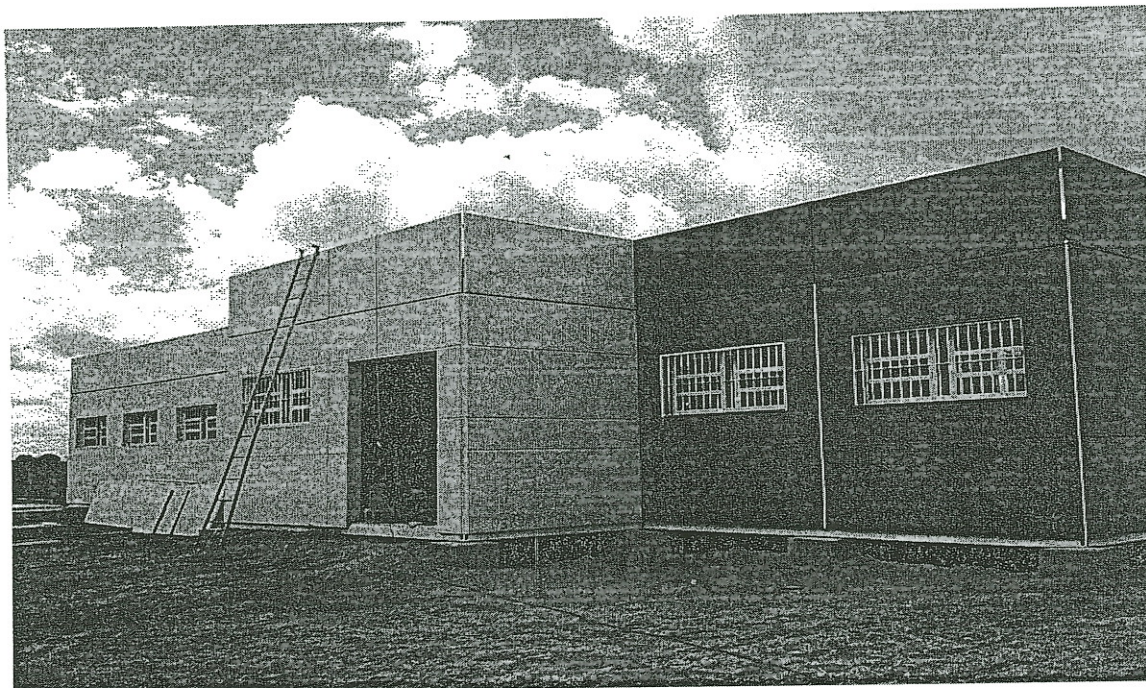


Fonte: Gestor do Contrato RDC 001/2017.

São Luís do Quitunde: obra em andamento mais de 90% executada, Ordem de Serviço expedida em 15 de maio de 2017 até a suspensão do contrato já transcorreram 113 dias em um total de 120 dias prazo contratual para execução da obra;

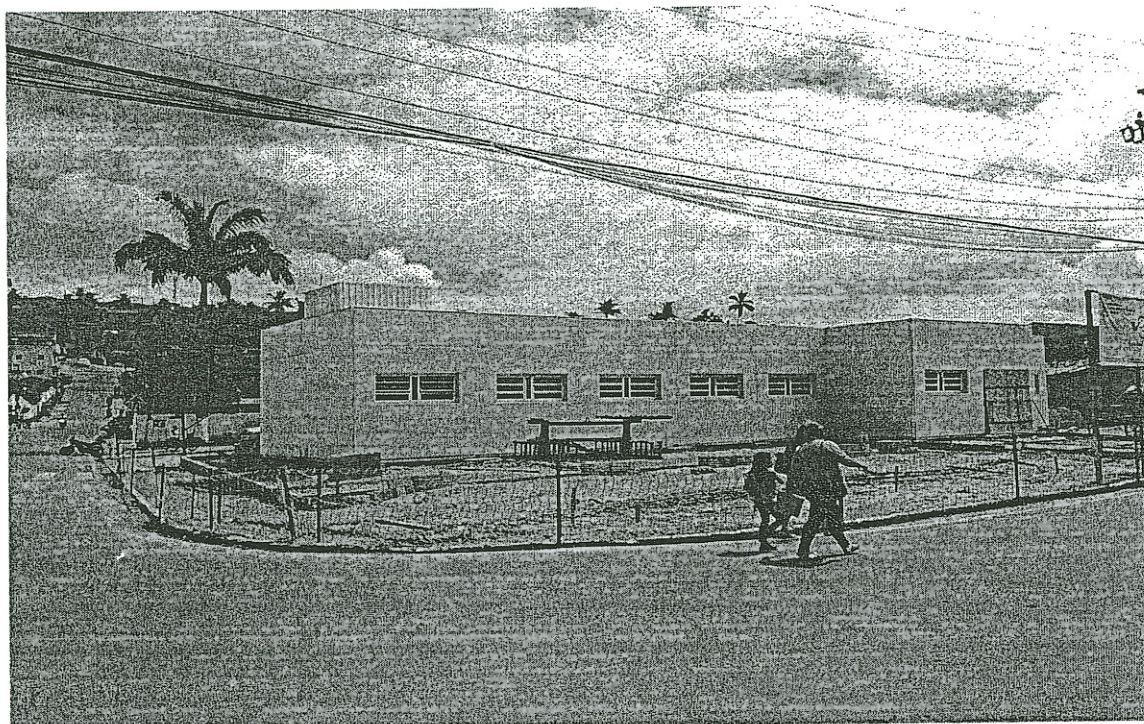

Fonte: Gestor do Contrato RDC 001/2017

Junqueiro: obra em andamento mais de 90% executada, Ordem de Serviço expedida em 15 de maio de 2017 até a suspensão do contrato já transcorreram 113 dias em um total de 120 dias prazo contratual para execução da obra;

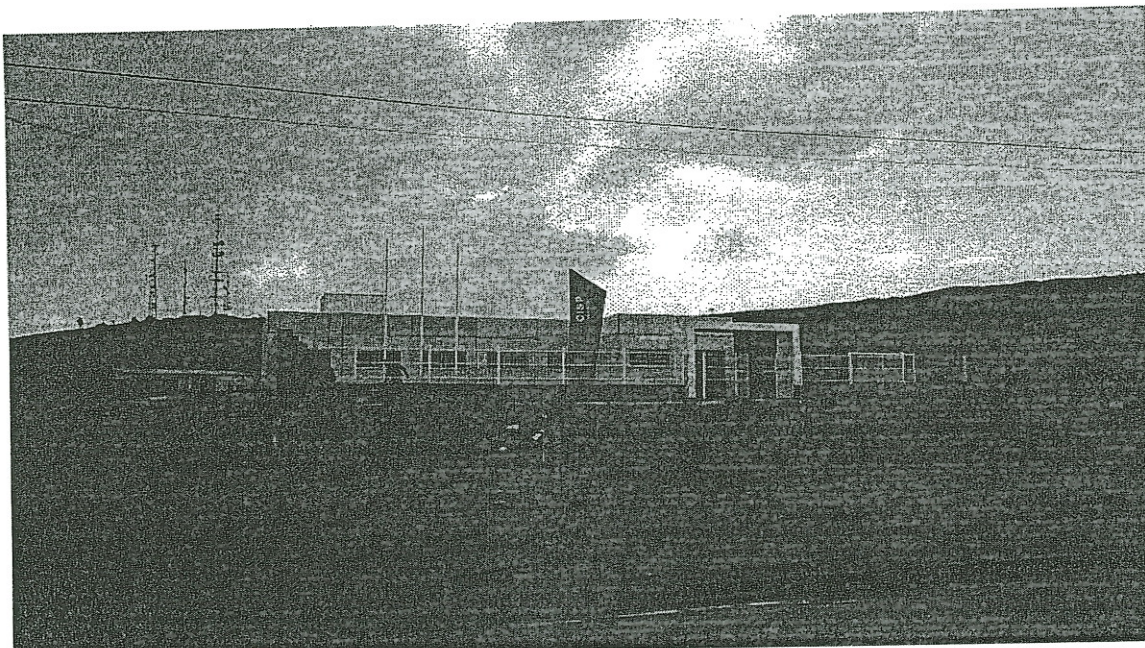

Fonte: Gestor do Contrato RDC 001/2017.

Pão de Açúcar: ainda sem previsão de sua execução terreno indefinido por parte da Prefeitura;

Informo ainda que o Contrato RDC 001/2017 foi suspenso em decorrência do processo de numero 2100.1601/2017, que trata da prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias do supracitado contrato, pelos expostos em seu escopo, encontra-se no SERVAL Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas para análise aguardando seu retorno para em ato continuo segui a Procuradoria Geral do Estado de Alagoas. Suspensão esta devidamente autorizada pelo Exmo. Senhor Delano Sobral Rolim, Secretário Executivo de Gestão Interna e devidamente publicada em DOE-AL de 05 de setembro do ano de 2017.

Salientando que este Gestor se baseia nas informações colhidas durante visitas periódicas que realiza pessoalmente aos locais de execução, todavia não entra em detalhes técnicos de Engenharia, uma vez que não tem habilitação para tal.

Diante das breves informações, coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da Gestão do Referido Contrato.

Maceió 11 de setembro do ano de 2017.


FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO TEN CEL PMAL
MAT: 81.702 GESTOR DO CONTRATO
