



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
<http://www.seguranca.al.gov.br>

Mem nº 26/CFO/2017

Em 22 de setembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR - Cel. PMAL-RR

Secretário de Estado da Segurança Pública de Alagoas

Assunto: Envio de relatório sobre a obra do complexo de delegacias DHPP/DRN

Senhor Secretário,


Através do presente, e na condição de gestor do contrato RDC 02/2017, encaminho a V.Exa. o relatório 01/2017, referente a visita técnica ao local da obra de construção do complexo de delegacias DHPP/DRN, efetivada em 21 de setembro de 2017.

Respeitosamente.

Gilson Gomes dos Passos
301.010-4

Chefia de Fiscalização de Obras/SSP

*Recebido
em 22/09/17
hiparpe*





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 01/2017

1. INTRODUÇÃO

Na condição de Gestor do contrato RDC 02/217 e objetivando dar andamento à obra foi realizada no dia 21 de setembro de 2017, as 9 horas, uma visita técnica ao terreno onde será construído o complexo de delegacias DHPP/DRN.

Estiveram presentes ao local os engenheiros André Souza Borba e Alexandre Machado, representantes da empresa Verdi Sistemas Construtivos S.A. e responsáveis pela obra.

O objetivo da visita técnica ao local do empreendimento foi, na qualidade de gestor do contrato, verificar “in loco” o andamento da execução dos serviços da obra

2. DADOS GERAIS.

2.1. Modalidade contrato – Regime Diferencial de Contrato

2.2 Valor do contrato - R\$ 6.360.000,00

2.3. Contrato nº - RDC 02/2017

2.4. Contratante – Secretaria de Estado da Segurança Pública


2.5. Contratado – Verdi Sistemas Construtivos S.A.

2.6. Prazo de vigência do contrato – 360 dias

2.7. Prazo de execução da obra - 180 dias

2.8. Objeto do contrato – Elaboração de projetos executivos e execução das obras de construção do complexo de delegacias DHPP e DRN

2.9. Endereço da obra – Avenida Jorge Montenegro de Barros – Chã de bebedouro – Maceió – Alagoas






GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

3. RESUMO DA OBRA

- 3.1. A placa da obra está instalada
- 3.2. O canteiro de obras está instalado
- 3.3. As escavações das fundações do muro já foram concluídas
- 3.4. As armações das fundações do muro já estão sendo executadas
- 3.5. A escavação das fundações dos pilares do muro está concluída
- 3.6. Os bloco cerâmicos (com resistência de 6 mpa) do fechamento do muro já estão no local
- 3.7. A sondagem do solo foi concluída
- 3.8. A terraplanagem do terreno foi concluída
- 3.9. A ligação elétrica provisória foi executada
- 3.10 A ligação provisória de abastecimento de água foi executada
- 3.11. O aço e a concretagem da fundação do muro serão executados na segunda-feira próxima – 25.09.2017
- 3.12. A execução do muro terá início na próxima terça-feira - 26.09.2017
- 3.13. A equipe de execução no local de trabalho conta com 15 operários

4. RESUMO DO RELATÓRIO

Apesar dos entraves burocráticos das notificações e dos embargos de obra efetivados pela SEMPMA-Secretaria Municipal de Proteção do meio Ambiente/Maceió, as obras estão sendo executadas dentro de um ritmo bastante satisfatório. Os serviços preliminares de instalações provisórias foram executados dentro da normalidade e a obra continua com seu andamento normal.





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com


5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PLACA DA OBRA INSTALADA



BLOCOS CERÂMICOS NO LOCAL DA OBRA







GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com



ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO CONCLUÍDA

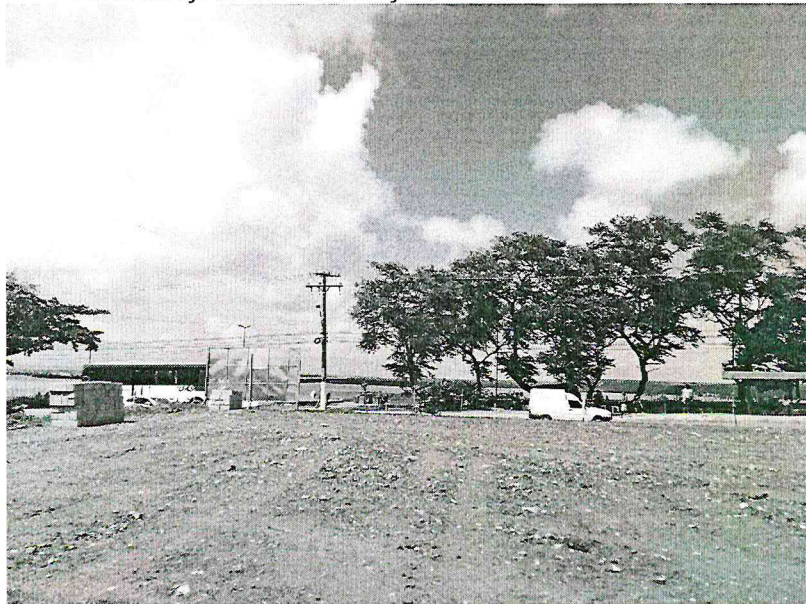


TERRAPLENAGEM DO TERRENO CONCLUÍDA







GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

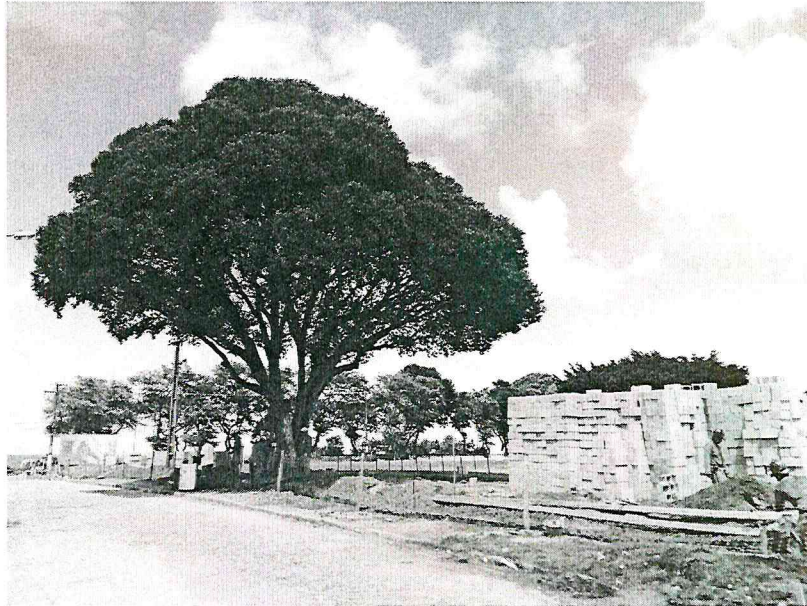

VISTA GERAL DA OBRA

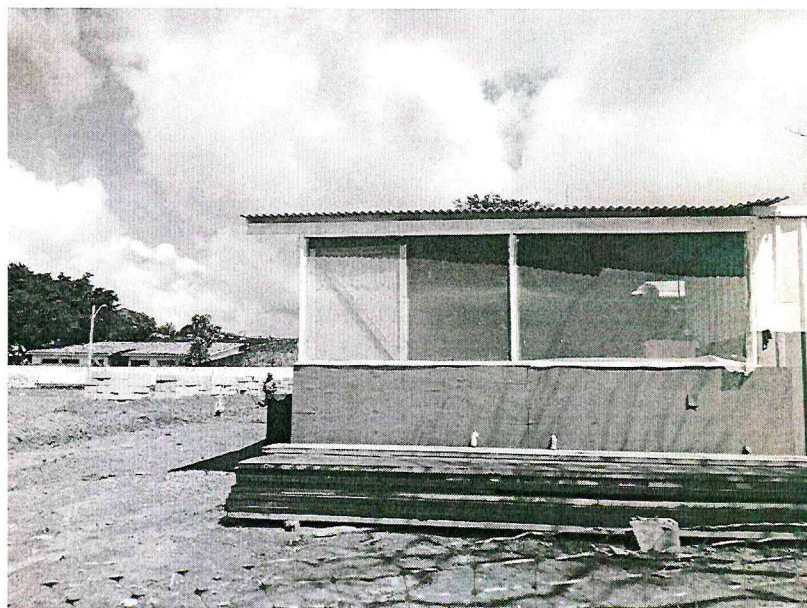


CANTEIRO DE OBRAS INSTALADO





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

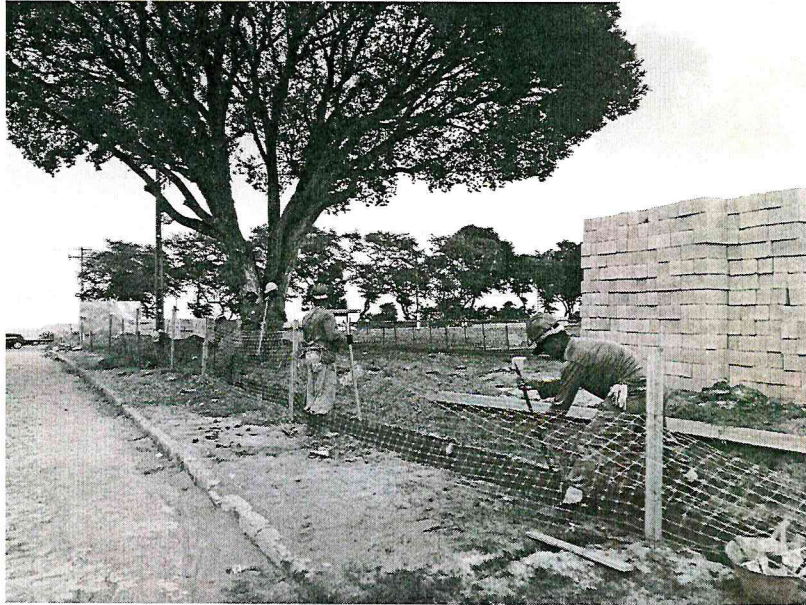

MONTAGEM DAS FORMAS DOS PILARES DO MURO

É o relatório.

Respeitosamente.

Maceió, 22 de setembro de 2017.

GILSON GOMES DOS PASSOS
Chefia de Fiscalização de Obras/CFO-SSP
Gestor do Contrato RDC 02/2017

