



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 02/2017

1. INTRODUÇÃO

Na condição de Gestor do contrato RDC 02/217 e objetivando dar andamento à obra foi realizada no dia 11 de Outubro de 2017, às 9 horas, uma visita técnica à obra onde está sendo construído o complexo de delegacias DHPP/DRN.

Estiveram presentes ao local os engenheiros André Souza Borba e Alexandre Machado, representantes da empresa Verdi Sistemas Construtivos S.A. bem como o fiscal da obra, engenheiro do Serveal Ronaldo Patriota.

O objetivo da visita técnica ao local do empreendimento foi, na qualidade de gestor do contrato, verificar "in loco" o andamento da execução dos serviços.

2. DADOS GERAIS.

2.1. Modalidade contrato – Regime Diferencial de Contrato / RDC

2.2 Valor do contrato - R\$ 6.360.000,00

2.3. Contrato nº - RDC 02/2017

2.4. Contratante – Secretaria de Estado da Segurança Pública

2.5. Contratado – Verdi Sistemas Construtivos S.A.

2.6. Data início da obra – 08 de agosto de 2017

2.7. Data prevista para conclusão da obra – 180 dias

2.8. Objeto do contrato – Elaboração de projetos executivos e execução das obras de construção do complexo de delegacias DHPP e DRN

2.9. Endereço da obra – Avenida Jorge Montenegro de Barros – Chã de bebedouro – Maceió – Alagoas





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

3. RESUMO DO ANDAMENTO DA OBRA

3.1. Os 191 blocos de fundação de apoio dos módulos construtivos já estão todos concretados.

3.2. O muro está com 50% das obras concluídas.

3.3. A base do gerador está concretada e concluída.

3.4. De um total de 56 módulos dos ambientes (monoblocos) que compõem a obra, 37 unidades já foram montadas no local.

3.5. A previsão é que até 25 de outubro todos os 56 monoblocos estarão montados no local.

3.6. O cronograma da obra está seguindo o ritmo normal de andamento.

3.7. A obra conta atualmente com 20 operários trabalhando no local.

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Os blocos de fundação foram concluídos






GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com



O muro está 50% concluído




A base do gerador está concluída







GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

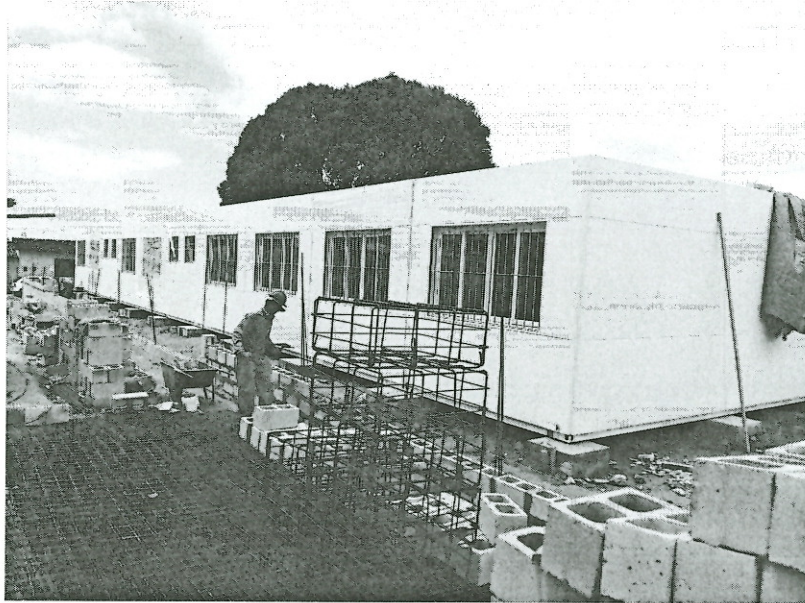

20 módulos dos ambientes já estão montados

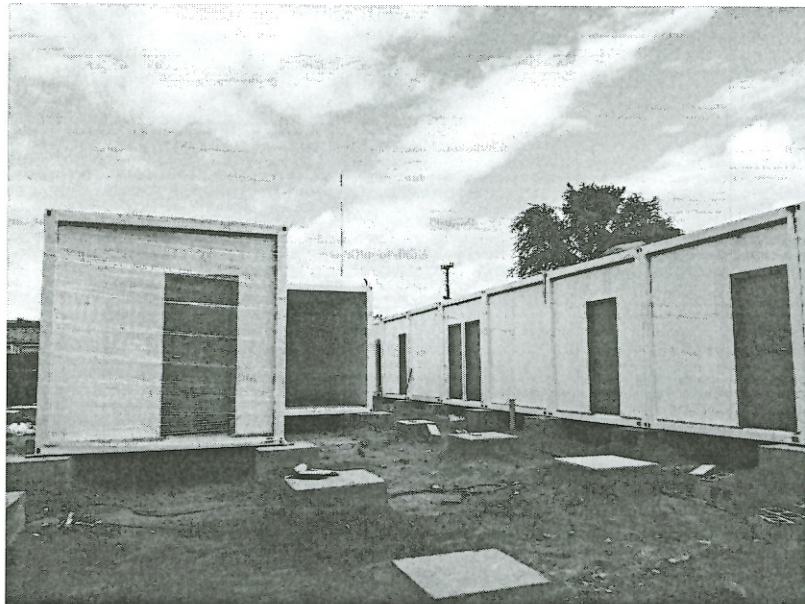


20 módulos dos ambientes já estão montados





GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CFO-Chefia de Fiscalização de Obras
<http://www.seds.al.gov.br> Email: gilson.passos@hotmail.com

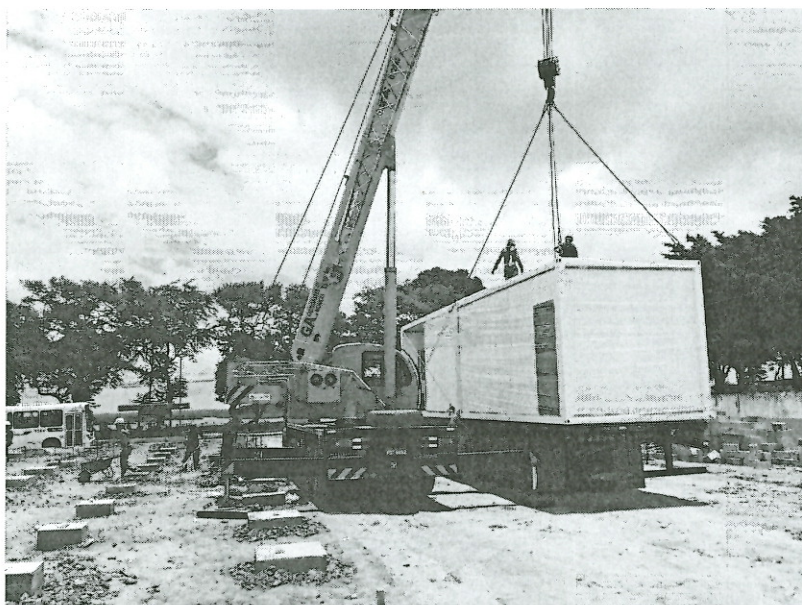

A previsão é que até 25 de outubro todos os módulos dos ambientes estejam montados
no local

É o relatório.

Maceió-Alagoas, 16 de outubro de 2017.

GILSON GOMES DOS PASSOS
Chefia de Fiscalização de Obras/CFO-SSP
Gestor do Contrato RDC 02/2017

