



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2018-RDC

Memo nº05/2018

Maceió-AL 25 de maio de 2018

A Vossa Excelência

Paulo Domingo de Araújo Lima Júnior

Secretário de Estado da Segurança Pública

C/C Dr. C/C para o Sr. **Carlos Guimarães Trindade Neto** *Secretário Executivo de Gestão Interna* e Sua Senhoria **Tânia Maria Lisboa Pereira** Superintendente do Planejamento Orçamento, Finanças e Contabilidade

Assunto: Entrega de Relatório II

Por meio do presente encaminho a Vossa Excelência relatório I que tem como assunto a gestão do Contrato Nº 001/2018-RDC que trata das Construções dos CISP'S dos Municípios de **Batalha, Mata Grande, Major Isidoro, Messias e São Miguel dos Milagres**, pela Empresa VERDI LTDA.

FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO- TEN CEL QOC PMAL
GESTOR DO CONTRATO 001-2018/RCD

25.05.2018
Sy.
Synthya.

Recb em
25/05/18
michelly






GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2018-RDC

RELATÓRIO II

Relatório do Contrato do contrato 001-2018 RDC datado de 12 de março de 2018 no valor de R\$ 9.159.023,51, valor por unidade de R\$ 1.831.804,70 tem como objeto a construção de 05 CISP nos Municípios de **Batalha, Mata Grande, Major Isidoro, Messias e São José dos Milagres.**

Situação das Construções dos CISP'S:

- **Batalha:** Módulos montados, em fase de acabamento;
- **Mata Grande:** Módulos montados, em fase de acabamento;
- **Major Isidoro:** Módulos montados, em fase de acabamento;
- **Messias:** Ordem de Serviço emitida no dia 26/03/2018, todavia, diante das informações contidas no Ofício do Eng. Civil Alexandre Machado, datado de 03 de Abril do corrente ano que trata em problemas contidas na terra plangem do terreno, chegando à retirada de edificações este Gestor suspendeu a Obra do referido CISP até que o motivo da suspensão seja sanado por parte do município. Salientando que até o momento a prefeitura não se manifestou quanto ao termino do aterro do referido terreno, comunico que este **Gestor** apesar de não ser Técnico da área de Engenharia fez uma visita pessoalmente ao terreno para verificar o andamento das obras como se vê nas fotos abaixo:

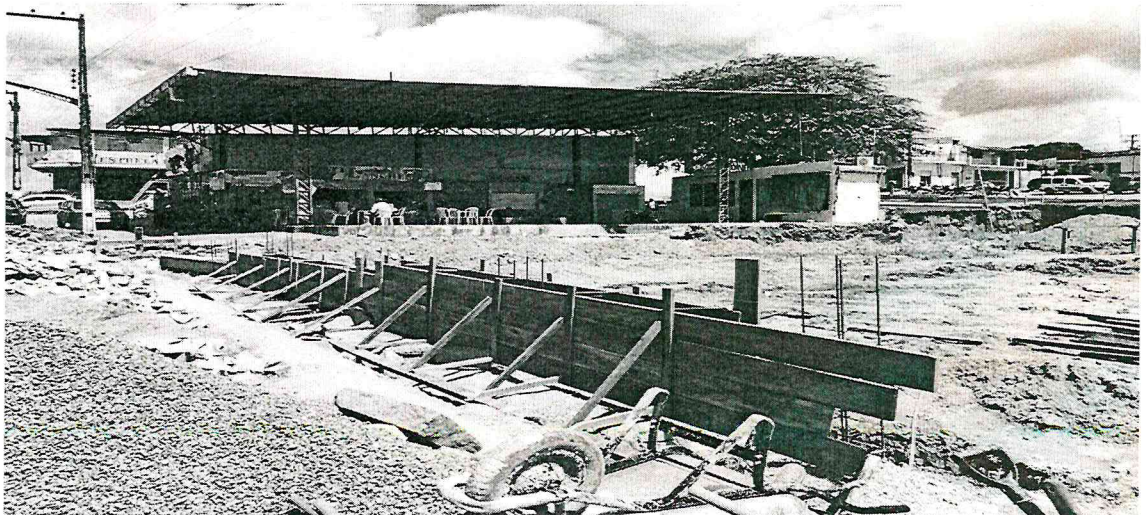



Fonte: O próprio Gestor do Contrato.

- **São José dos Milagres:** Módulos montados, em fase de acabamento.

Diante das breves informações, coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da Gestão do Referido Contrato.

Maceió 25 de maio do ano de 2018.


FERNANDO LUIS DE ANDRADE ARAUJO TEN CEL PMAL
GESTOR DO CONTRATO – RDC 001/2018



CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CISP

ALAGOAS

OBRA:

PRAZO CONTRATUAL DE

120 dias

EXECUÇÃO:

| MUNICÍPIOS: | ORDEM DE SERVIÇO: | DIAS EXECUTADOS (30/05/2018) | SALDO DE EXECUÇÃO | ORDEM DE PARALIZAÇÃO | DATA DE INAUGURAÇÃO | CONTRATO | VALOR DA OBRA |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 26/03/2018 | 65 | 55 | - | A definir | RDC - 001/2018 | R\$ 1.831.804,70 |
| BATALHA | 26/03/2018 | 65 | 55 | - | A definir | RDC - 001/2018 | R\$ 1.831.804,70 |
| MATA GRANDE | 26/03/2018 | 65 | 55 | - | A definir | RDC - 001/2018 | R\$ 1.831.804,70 |
| MAJOR IZIDORO | 26/03/2018 | 65 | 55 | - | A definir | RDC - 001/2018 | R\$ 1.831.804,70 |
| MESSIAS (PARALIZADA) | 26/03/2018 | 9 | 111 | 04/04/2018 | A definir | RDC - 001/2018 | R\$ 1.831.804,70 |
| CAMPO ALEGRE | 15/05/2018 | 15 | 105 | - | A definir | RDC - 002/2018 | R\$ 1.831.804,70 |
| | | | | | | | R\$ 10.990.828,20 |
